

**ΤΙΤΛΟΣ: 1^η Διαδικτυακή Συνάντηση Έργου Mosaic – Τρίτη 4-11-2025**

Υπότιτλος: Αφορά όλα τα πακέτα εργασίας (Π1, Π2, Π3 και Π4) του έργου

05/11/2025

Η συγκεκριμένη διαδικτυακή συνάντηση μεταξύ όλων των εταίρων του έργου εντάσσεται στις τακτικές διαδικτυακές συναντήσεις του έργου που θα υλοποιούνται από τον Νοέμβριο του 2025 και σε όλη τη διάρκεια του έργου την 1^η Τρίτη του κάθε μήνα στις 13:00.

Διαδικτυακός Τόπος Συνάντησης:

<https://tuc-gr.zoom.us/j/84596447511?pwd=a0hkc081Vm1LNEJxWk9lL21zYkN0UT09>

Συμμετέχοντες:ΕΛΚΕ Πολυτεχνείου Κρήτης

- Αντωνιάδης Αριστομένης, Επιστημονικός Υπεύθυνος Έργου
- Κατσαμάκη Αναστασία, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Έργου
- Νικολιδάκης Ευάγγελος, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα
- Μουντάκη Ευανθία, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα
- Τρανταφίρ Μιχαήλ, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα
- Πολιτώφ Κων/νος, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα
- Χατζηδάκης Δημήτριος, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα

Ερευνητικό Κέντρο Φρέντερικ

- Λόντος Αντώνιος, Μέλος της ομάδας εργασίας
- Βαμβουρέλης Δημοσθένης, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα

Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ'

- Ηλιάδης Ιωάννης, Υπεύθυνος εκ μέρους της ομάδας εργασίας του φορέα
- Δρακωνάκης Βασίλειος, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα

Τμήμα Αρχαιοτήτων – Υφυπουργείο Πολιτισμού

- Χαραλάμπους Ελευθέριος, Μέλος της ομάδας εργασίας του φορέα

Ο κ. Αντωνιάδης Α. ενημερώνει τους παραβρισκόμενους στη συνάντηση για την τρέχουσα κατάσταση του έργου όσον αφορά τις εργασίες που έχουν υλοποιηθεί, τις εργασίες που είναι σε εξέλιξη και τις εργασίες που θα ξεκινήσουν στο άμεσο μέλλον.

Πιο συγκεκριμένα η ενημέρωση καθώς και οι αποφάσεις που ελήφθησαν περιλάμβαναν τα εξής:

Για το Πακέτο Εργασίας 1:

Η κα. Κατσαμάκη Α. ενημερώνει ότι έχει ήδη δημιουργηθεί φάκελος onedrive για κοινόχρηστη χρήση φακέλων όπου ο κάθε φορέας θα πρέπει να δηλώσει ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση εκεί. Ο συγκεκριμένος φάκελος θα χρησιμοποιηθεί για τη συλλογή και αποθήκευση αρχείων που αφορούν τόσο τα παραδοτέα του έργου όσο και αρχεία που σχετίζονται με την οικονομική-διοικητική διαχείριση. Οι υπόλοιποι φορείς συμφωνούν να δηλώσουν άμεσα ποια άτομα θα έχουν πρόσβαση εκεί οπότε και την σχετική ευθύνη.

Όσον αφορά τις λοιπές εργασίες διαχείρισης η κα. Κατσαμάκη ενημερώνει ότι έχει ήδη υποβληθεί η 1^η δήλωση δαπανών για το Πολυτεχνείο Κρήτης που έχει παραλάβει την 1^η δόση χρηματοδότησης και βρίσκεται στο στάδιο να παραλάβει τη 2^η δόση που έχει ζητήσει. Όσον αφορά την αγορά του εξοπλισμού ο σχετικός διαγωνισμός έχει ολοκληρωθεί και βρίσκεται στο στάδιο οι τελικοί ανάδοχοι να υπογράψουν τις σχετικές συμβάσεις. Σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διαδικασία για την αγορά του λογισμικού. Τέλος για την πρόσληψη προσωπικού αναμένεται ότι την υπάρχουσα ομάδα εργασίας θα στελεχώσουν ακόμα 1 ή 2 άτομα ανάλογα με τις ανάγκες του έργου στο πακέτο εργασίας 5 (αυτό θα είναι ένα θέμα που θα ξεκαθαρίσει μέσα στο 1^ο εξάμηνο του 2026).

Οι υπόλοιποι φορείς σε αυτό το σημείο ενημερώνουν ότι έχουν προχωρήσει τις διαδικασίες ανάθεσης για την πιστοποίηση των δαπανών τους ενώ υπάρχουν καθυστερήσεις στην πρόσληψη προσωπικού για διάφορους λόγους. Στο Τμήμα Αρχαιοτήτων η 1^η πρόσκληση που δημοσιεύτηκε για την πρόσληψη ενός αρχαιολόγου ήταν άγονη οπότε η διαδικασία θα επαναληφθεί. Στο Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ' η διαδικασία καθυστέρησε οπότε εκτιμάται ότι το άτομο που θα προσληφθεί θα ξεκινήσει να εργάζεται από Ιανουάριο του 2026. Στο ερευνητικό κέντρο Φρέντερικ έχει ξεκινήσει η απασχόληση προσωπικού στο έργο και αναμένεται η διαδικασία προσλήψεων να ολοκληρωθεί στο άμεσο μέλλον. Όσον αφορά τον εξοπλισμό και οι τρεις φορείς από την Κύπρο δεν έχουν ακόμα παραλάβει τον εξοπλισμό ισχύει όμως ότι έχουν ξεκινήσει τις σχετικές διαδικασίες για την απόκτησή του.

Σε αυτό το σημείο ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπου και αποφασίζεται όλοι οι φορείς να φροντίσουν το συντομότερο δυνατό να ολοκληρώσουν τις απαιτούμενες εργασίες για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού και την αγορά του εξοπλισμού προκειμένου να μην υπάρξουν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των πακέτων εργασίας 4 και 5 που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Επιπλέον, στη δια ζώσης συνάντηση μεταξύ όλων των εταίρων του έργου που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2025 θα πρέπει όλοι οι εταίροι να παρουσιάσουν την πορεία των ενεργειών που έχουν υλοποιήσει σε ότι αφορά τα διαχειριστικά – τεχνικά – οικονομικά θέματα του έργου.

Για το Πακέτο Εργασίας 2:

Ο κ. Αντωνιάδης ενημερώνει ότι έχουν ήδη δρομολογηθεί οι προκαταρκτικές εργασίες για την διοργάνωση της ημερίδας του έργου στα Χανιά την Πέμπτη στις 18 Δεκεμβρίου 2025 το πρωί στο αμφιθέατρο του Αρχαιολογικού Μουσείου. Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εκδήλωσης οι ενέργειες που χρειάζεται να γίνουν στο προσεχές μέλλον είναι οι εξής:

- Ορισμός των ομιλητών (αρχική πρόταση είναι ένα άτομο από τον κάθε φορέα) όπου θα δώσει μια ομιλία ως 20 λεπτά. Μόλις οριστικοποιηθούν οι ομιλητές θα πρέπει να στείλουν σύντομα βιογραφικά και τίτλο της ομιλίας τους προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό πρόγραμμα της εκδήλωσης.
- Να φτιαχτεί πρόσκληση και να σταλεί σε ευρύ πλήθος (διαχειριστική αρχή, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπροσώπους τοπικών φορέων, άτομα που σχετίζονται με το αντικείμενο του έργου, κ.α.
- Να φτιαχτεί φυλλάδιο, δίφυλλο ή τετράφυλλο με το πληροφορίες για το πρόγραμμα και την ημερίδα.
- Να φτιαχτούν αφίσες, roll-up banner με στοιχεία του έργου προκειμένου να τοποθετηθεί στον χώρο έξω από την εκδήλωση.

- Να φτιαχτούν λίστες που θα συμπληρωθούν από τους παραβρισκόμενους.
- Να φτιαχτούν badges με τα στοιχεία όσων εργαστούν στη υλοποίηση της ημερίδας.
- Να γίνουν σχετικές συνεννοήσεις με την Αρχαιολογική υπηρεσία για την παραχώρηση του χώρου και τους συνεργάτες τους (εταιρεία που έχει την ευθύνη για τα οπτικοακουστικά μέσα της αίθουσας και το catering που θα προσφέρει καφέ στο ενδιάμεσο της εκδήλωσης).
- Να φτιαχτεί κάποιο υλικό που θα προσφερθεί σε όσους παραστούν στην εκδήλωση.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση όπου και αποφασίζονται τα εξής:

Στην εκδήλωση εκτός από τον κ. Αντωνιάδη Α. θα μιλήσουν ακόμα οι κ.κ. Χαραλάμπους Ε. και Ηλιάδης Ι. Οι ομιλίες των κ.κ. Χαραλάμπους και Ηλιάδη θα σχετίζονται με την υπάρχουσα εκκλησιαστική πολιτιστική κληρονομιά της Κύπρου και θα εστιάζει στα ψηφιδωτά. Ανάλογα με το πώς θα διαμορφωθούν οι δύο αυτές ομιλίες θα δώσει μια μικρή ομιλία και ο κ. Λόντος. Οι ομιλίες των κ.κ. Αντωνιάδη και Λόντου θα αφορούν το περιεχόμενο και τους στόχους του έργου ενώ θα εστιάζουν στις μεθόδους ψηφιοποίησης, αναγνώρισης και τεχνολογιών κατεργασίας και αναπαραγωγής που θα χρησιμοποιηθούν.

Επιπλέον, στο ίδιο χρονικό διάστημα (μία μέρα πριν ή μία μέρα μετά την εκδήλωση) θα πραγματοποιηθεί συνάντηση εργασίας μεταξύ όλων των εταίρων του έργου στον χώρο του Εργαστηρίου Μικροκοπής και Κατασκευαστικής Προσομοίωσης του Πολυτεχνείου Κρήτης προκειμένου να εξεταστεί η μέχρι σήμερα πορεία υλοποίησης του έργου.

Για τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν οργανωτικά θέματα της εκδήλωσης θα οριστεί μια ομάδα από μέλη της ομάδας έργου του Πολυτεχνείου Κρήτης όπου και θα ανατεθούν οι εργασίες που πρέπει να γίνουν. Τέλος για την πορεία υλοποίησης των λοιπών ενεργειών στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 2 αποφασίζεται να παρουσιαστεί από όλους τους φορείς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των ενεργειών που έχουν ήδη υλοποιήσει ή σχεδιάζουν να υλοποιήσουν στη δια ζώσης συνάντηση που θα γίνει στα πλαίσια του έργου το Δεκέμβριο του 2025 στα Χανιά.

Για το Πακέτο Εργασίας 3:



Το λόγο παίρνει ο κ. Αντωνιάδης όπου και ενημερώνει τα υπόλοιπα μέλη ότι έχουν ολοκληρωθεί τα παραδοτέα 3.1, 3.2, 3.3 και 3.4 εκ μέρους του Πολυτεχνείου Κρήτης ενώ μένει να ελεγχθούν τα συγκεκριμένα παραδοτέα και να οριστικοποιηθούν στην τελική τους μορφή από τους υπόλοιπους φορείς. Για το παραδοτέο 3.4 εκκρεμεί να ελεγχθεί και να συμπληρωθεί από το Ερευνητικό Κέντρο Φρέντερικ και στη συνέχεια να ελεγχθεί από τους φορείς Ίδρυμα Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Τμήμα Αρχαιοτήτων προκειμένου να οριστικοποιηθεί.

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση μεταξύ όλων των φορέων όπου και αποφασίζονται τα εξής:

Το Πακέτο Εργασία 3 αν και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα ολοκληρώνεται στον 6^ο μήνα υλοποίησης του έργου (Οκτώβριος 2025) ισχύει ότι λόγω του ότι έχουν καθυστερήσει οι προσλήψεις προσωπικού για τους φορείς της Κύπρου δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες που απαιτούνται από τη δική τους πλευρά προκειμένου να οριστικοποιηθούν σε τελική μορφή. Αποφασίζεται να ζητηθεί σε επόμενη τροποποίηση (θα κατατεθεί στις αρχές του 2026) να παραταθεί η διάρκεια για όλα τα παραδοτέα του συγκεκριμένου πακέτου εργασίας κατά 4 μήνες (προτεινόμενη ημερομηνία λήξης Φεβρουάριος 2026) χωρίς αλλαγές στον προϋπολογισμό τους προκειμένου να είναι δυνατή η ολοκλήρωσή τους για όλους τους εταίρους.

Για το Πακέτο Εργασίας 4:

Το λόγο παίρνει ο κ. Αντωνιάδης όπου και ενημερώνει τους λοιπούς εταίρους ότι για το παραδοτέο 4.1 το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ολοκληρώσει τις εργασίες διερεύνησης από τη δική του πλευρά οπότε μένει να οριστικοποιήσει τη μορφή του συγκεκριμένου παραδοτέου το Ερευνητικό Κέντρο Φρέντερικ που έχει και την ευθύνη για την ολοκλήρωσή του με τη συνδρομή και των λοιπών φορέων από την Κύπρο.

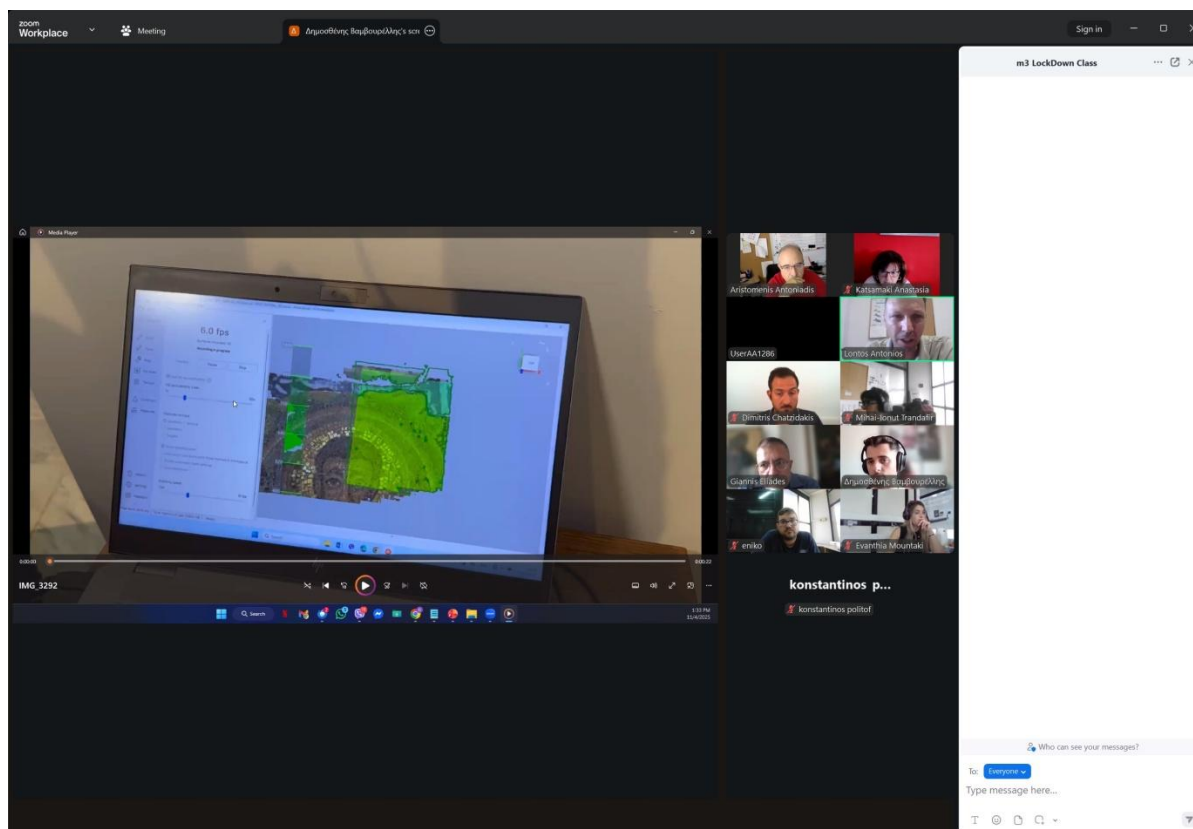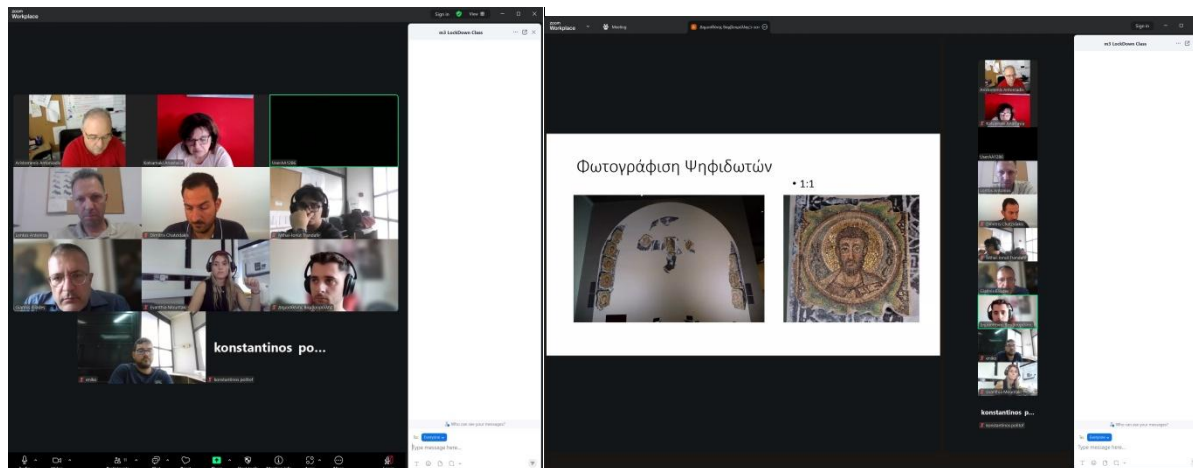

Για αυτό το λόγο προτείνεται να ζητηθεί σε μελλοντικό αίτημα τροποποίησης η παράταση στη διάρκεια του κατά 4 μήνες (σύμφωνα με το τρέχον χρονοδιάγραμμα το συγκεκριμένο παραδοτέο έληγε τον Οκτώβριο του 2025 οπότε και προτείνεται να ζητηθεί παράταση στη λήξη του ως και το Φεβρουάριο του 2026). Η συγκεκριμένη τροποποίηση κρίνεται αναγκαία εφόσον εκτός από τις καθυστερήσεις που υπάρχουν στην πρόσληψη εξωτερικών συνεργατών για τους φορείς της Κύπρου, υπάρχουν καθυστερήσεις και στην αγορά του εξοπλισμού του έργου. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη τροποποίηση αναμένεται να δώσει τον απαιτούμενο χρόνο και μέσα ώστε να ολοκληρωθεί η υλοποίηση του παραδοτέου 4.1 χωρίς προβλήματα.

Στη συνέχεια το λόγο παίρνει και πάλι ο κ. Αντωνιάδης όπου και ενημερώνει τους λοιπούς εταίρους ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει ξεκινήσει ήδη εργασίες στα πλαίσια και του παραδοτέου 4.2 όπου θα μπορέσει να παρουσιάσει περισσότερα στη διάρκεια της επόμενης συνάντησης έργου. Σε αυτό το σημείο το λόγο παίρνει και ο κ. Λόντος από το Ερευνητικό Κέντρο Φρέντερικ όπου και ενημερώνει τους λοιπούς εταίρους ότι και από τη δική τους πλευρά στα πλαίσια του πακέτου εργασίας 4 έχουν

γίνει δοκιμές ψηφιοποίησης και αναγνώρισης σε πραγματικά ψηφιδωτά. Στη συνέχεια ο κ. Βαμβουρέλης παρουσιάζει σύντομα βίντεο από τις συγκεκριμένες εργασίες δοκιμών αποτύπωσης / σκαναρίσματος πραγματικών ψηφιδωτών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί. Ο κ. Λόντος στη συνέχεια ενημερώνει ότι οι συγκεκριμένες δοκιμές θα συνεχιστούν και στις επόμενες μέρες οπότε στην επόμενη δια ζώσης συνάντηση του έργου θα παρουσιαστούν αναλυτικά αποτελέσματα για τις συνθήκες και τα τυχόν προβλήματα που προέκυψαν ώστε να αναζητηθούν λύσεις όπου απαιτείται.

Στο τέλος της συνεδρίασης με βάση ότι συζητήθηκε διαμορφώνεται η λίστα με τις άμεσες εργασίες και οι εκτιμώμενοι χρόνοι ολοκλήρωσής τους.

Συνοπτική Λίστα Άμεσων Εργασιών

	Ενέργειες	Εκτιμώμενες ημερομηνίες ολοκλήρωσης
1	ΠΕ1. Συμπλήρωση emails ατόμων στον ηλεκτρονικό φάκελο του έργου όπου θα τηρείται ηλεκτρονικό αρχείο παραδοτέων και αρχείων που σχετίζονται με τη διαχείριση του έργου	6/11/2025
2	ΠΕ1. Ολοκλήρωση των διαδικασιών πρόσληψης εξωτερικών συνεργατών για όλους τους φορείς του έργου	Ιανουάριος 2026
3	ΠΕ1. Ολοκλήρωση των διαδικασιών αγοράς εξοπλισμού – λογισμικού για όλους τους φορείς του έργου	Ιανουάριος 2026
4	ΠΕ1. Υποβολή 2 ^{ης} δήλωσης δαπανών για το Πολυτεχνείο Κρήτης	Δεκέμβριος 2025
5	ΠΕ2. Ολοκλήρωση διαδικασιών για το κλείσιμο αίθουσας, catering και κάλυψης απαιτήσεων ήχου και προβολής στην ημερίδα του έργου στις 18 Δεκεμβρίου	25/11/2025
6	Ορισμός ομιλητών – πρόγραμμα ημερίδας - ετοιμασία πρόσκλησης – αποστολή σε φορείς και άλλους ενδιαφερόμενους	17/11/2025
7	Ετοιμασία roll up banner, αφίσας και άλλου υλικού προώθησης που θα δοθεί στους παραβρισκόμενους στην ημερίδα του έργου	12/12/2025
8	Ολοκλήρωση των εργασιών στα παραδοτέα του πακέτου εργασίας 3 – αίτημα για 2 ^η παράταση κατά 4 μήνες	Φεβρουάριος 2026
9	Ολοκλήρωση των εργασιών στο παραδοτέο 4.1 – αίτημα για 2 ^η παράταση κατά 4 μήνες	Φεβρουάριος 2026

Πρακτικά της συνάντησης τηρήθηκαν από την Αναστασία Κατσαμάκη, Υπεύθυνη Επικοινωνίας Έργου και μέλος της ομάδας εργασίας ΕΛΚΕ-Πολυτεχνείο Κρήτης.
